


















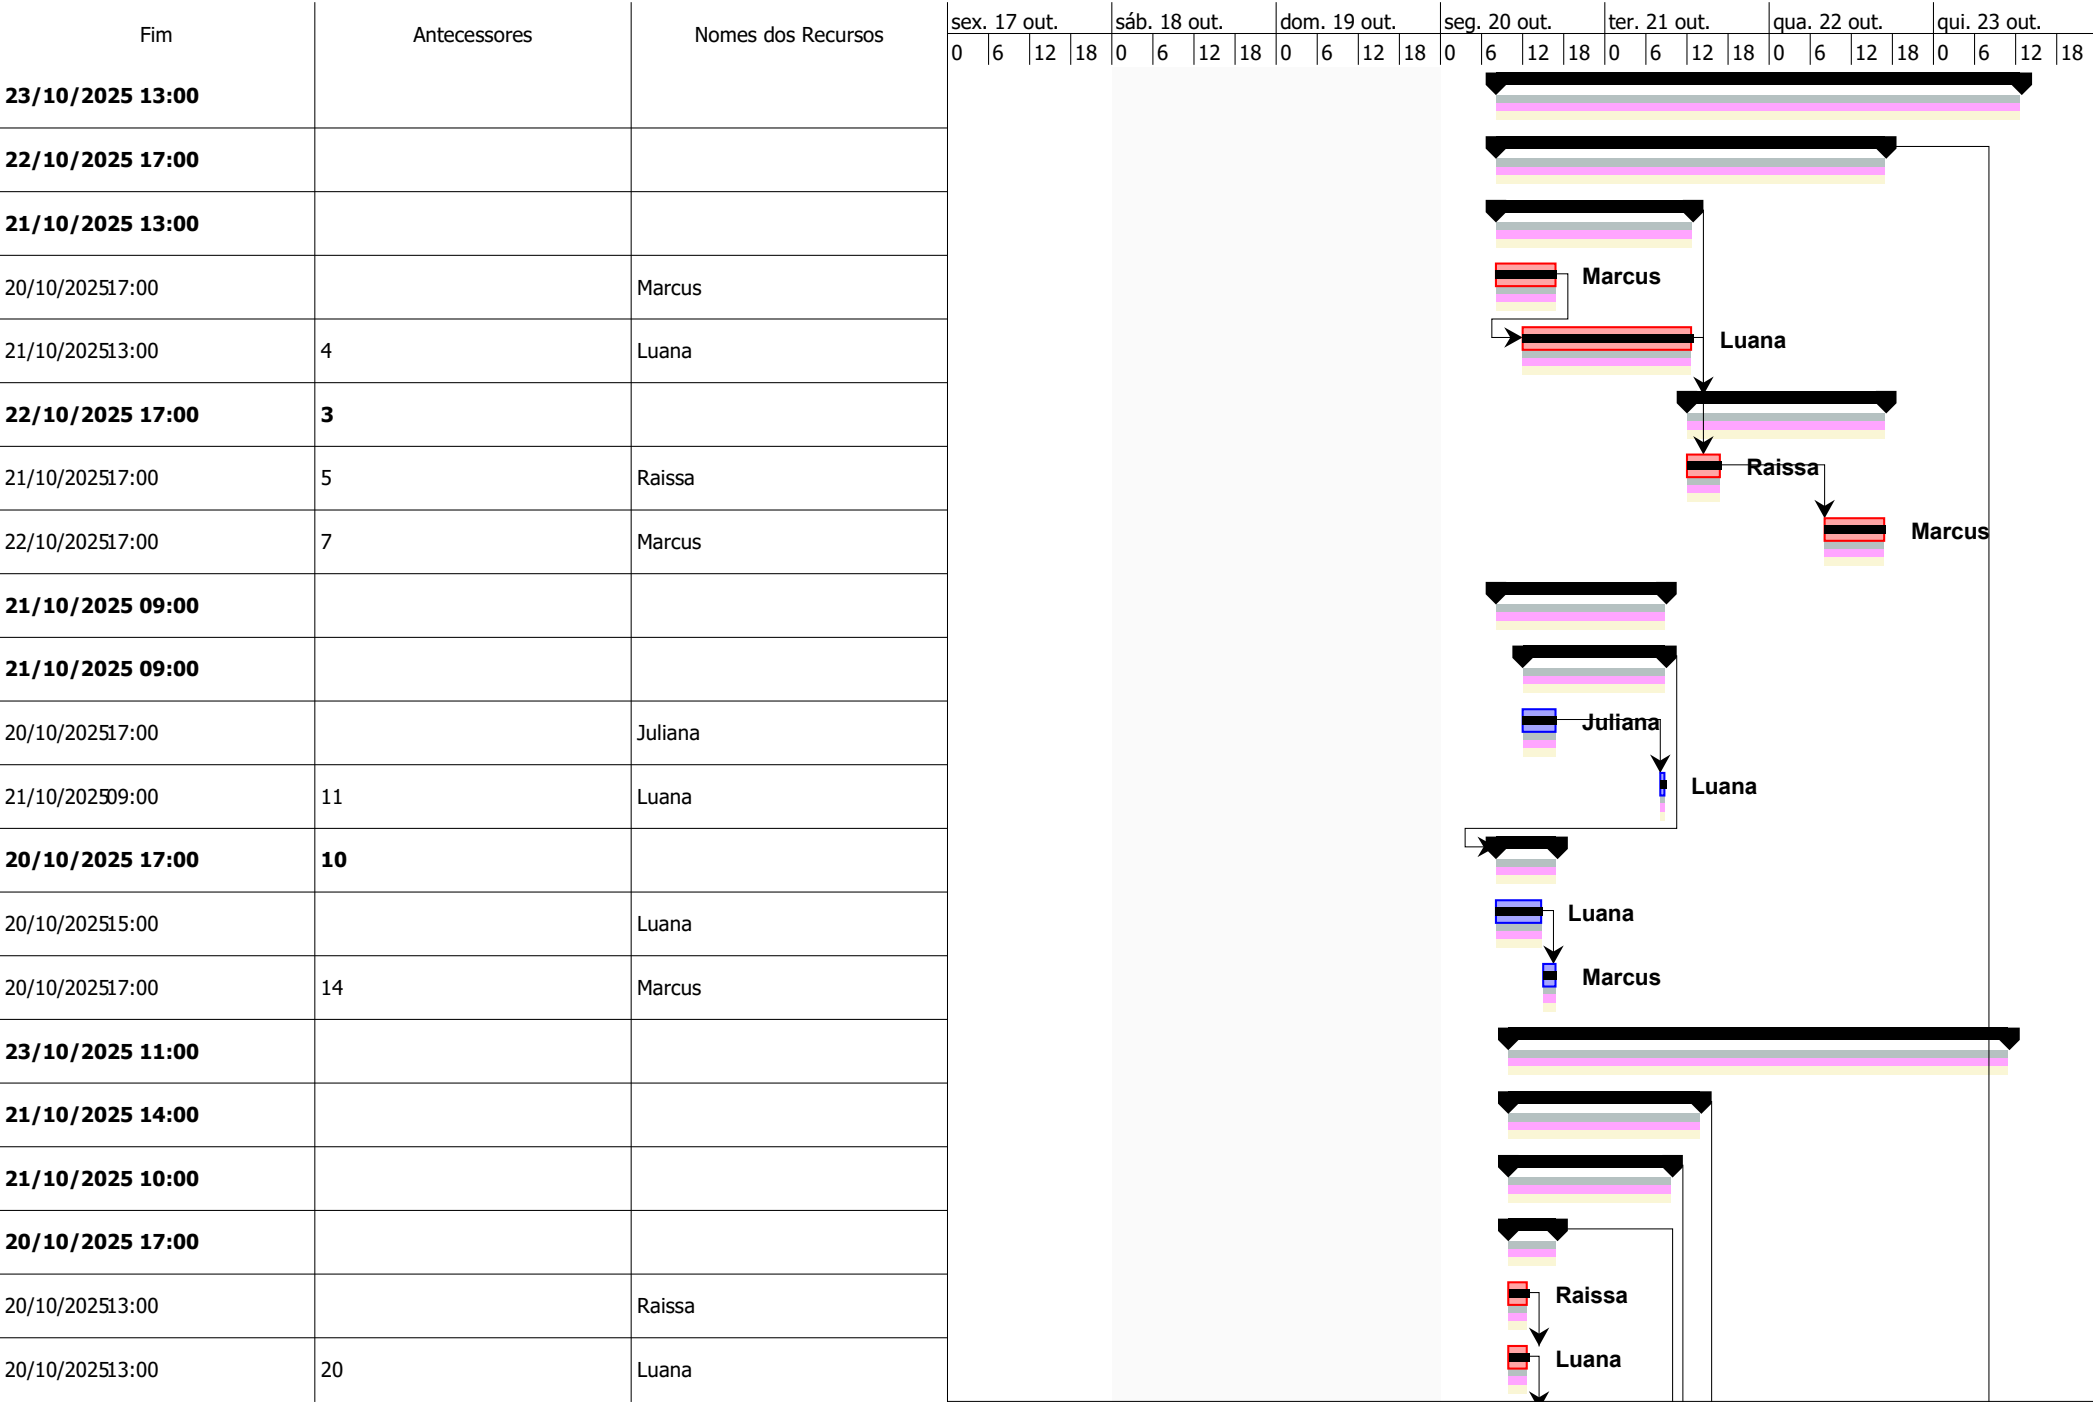

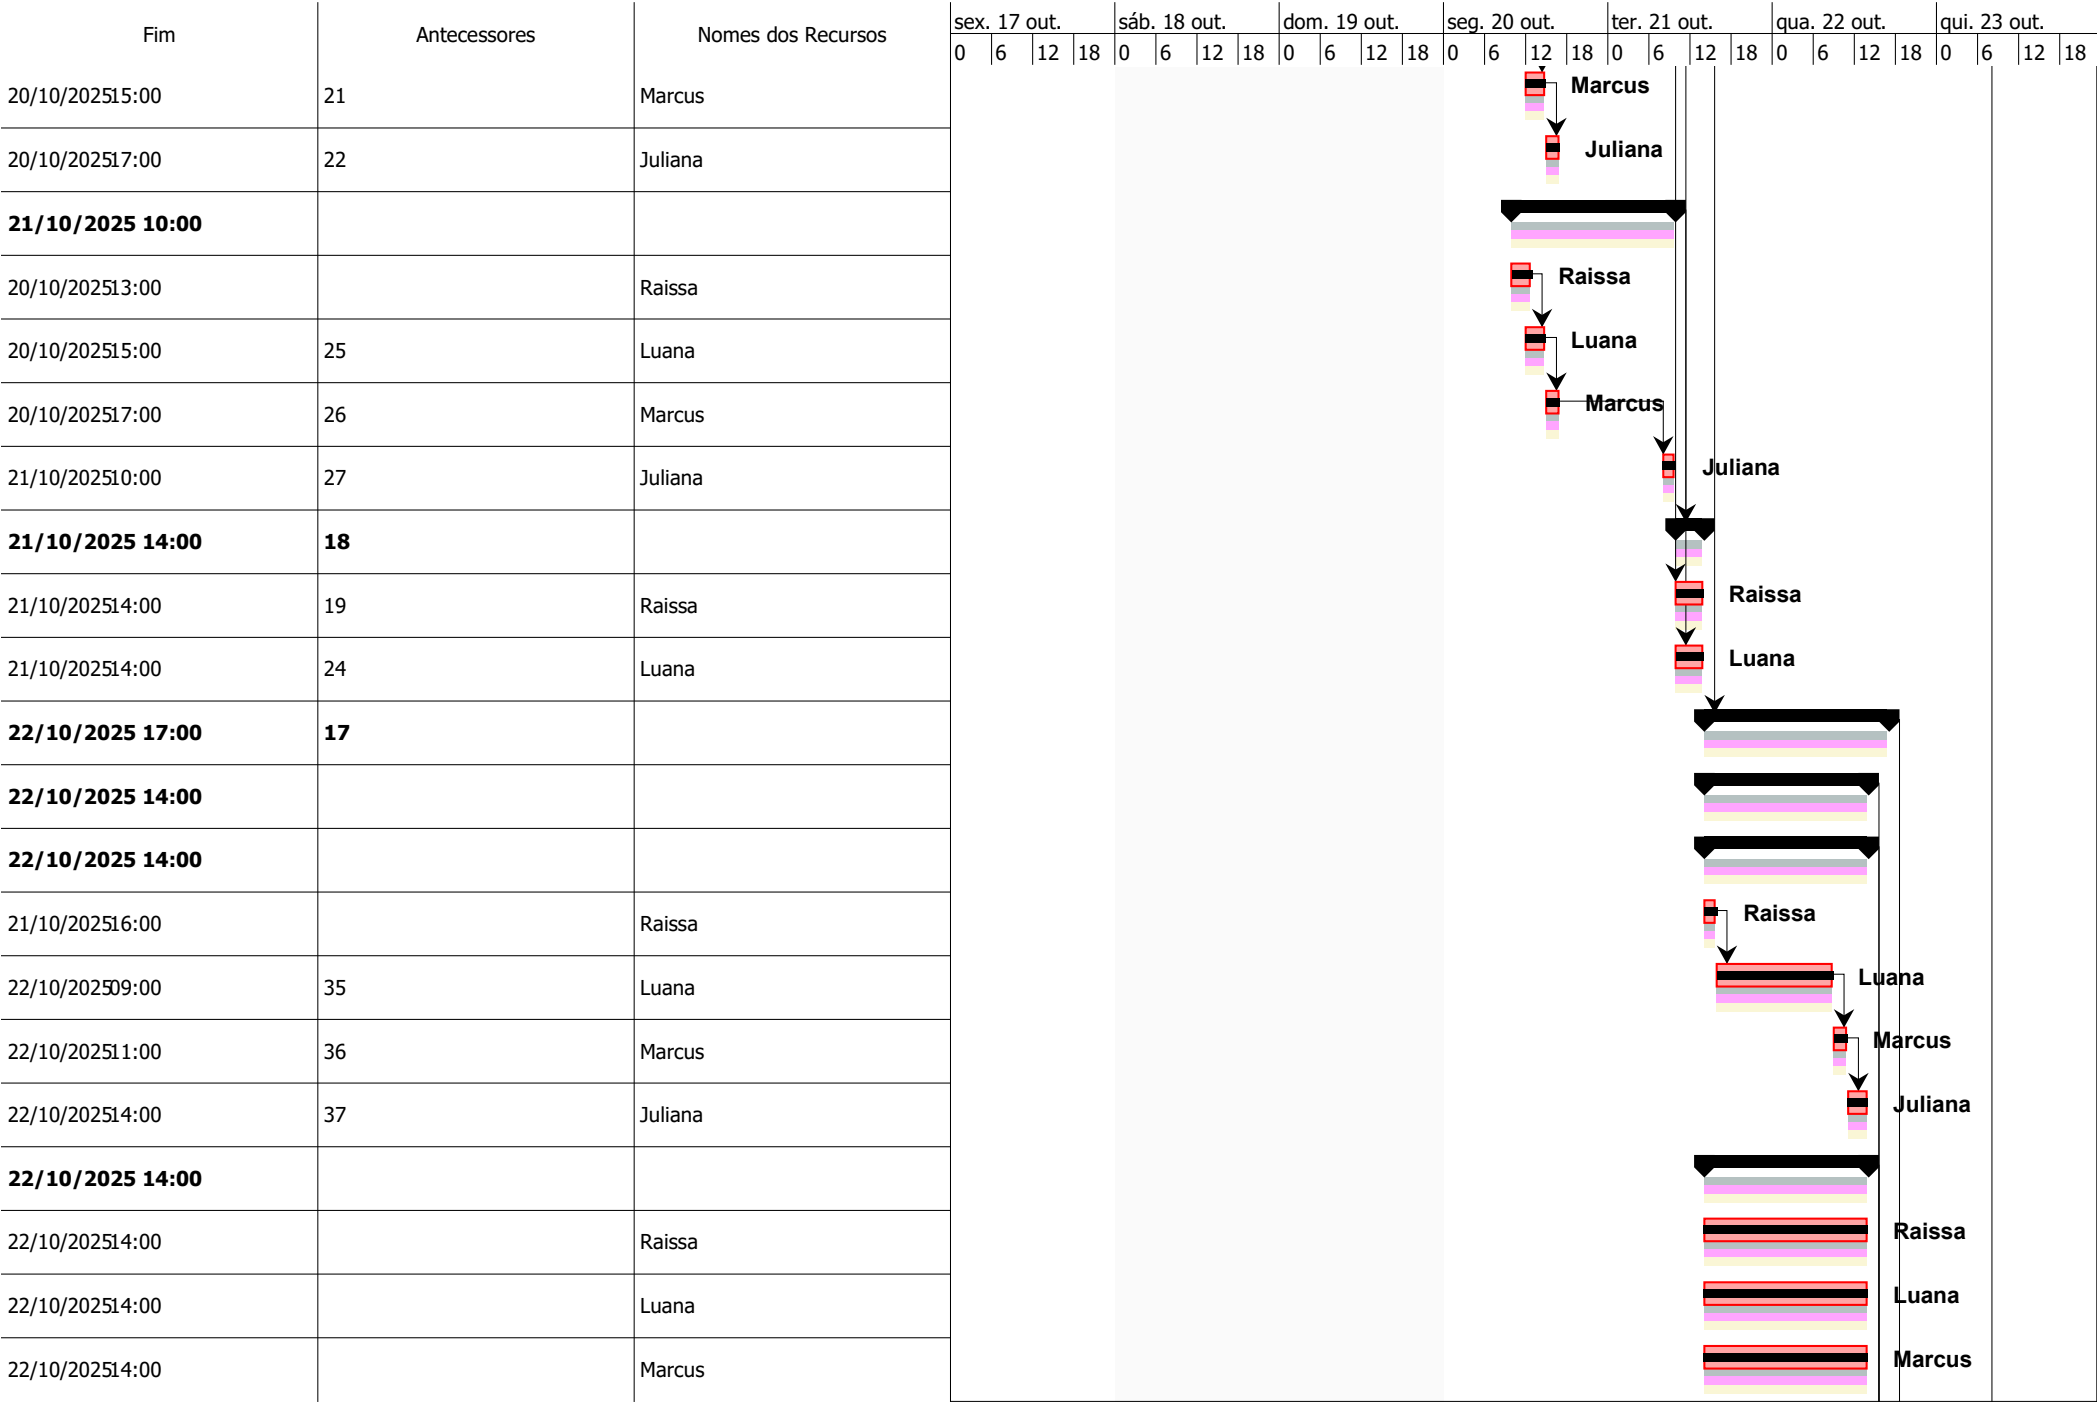







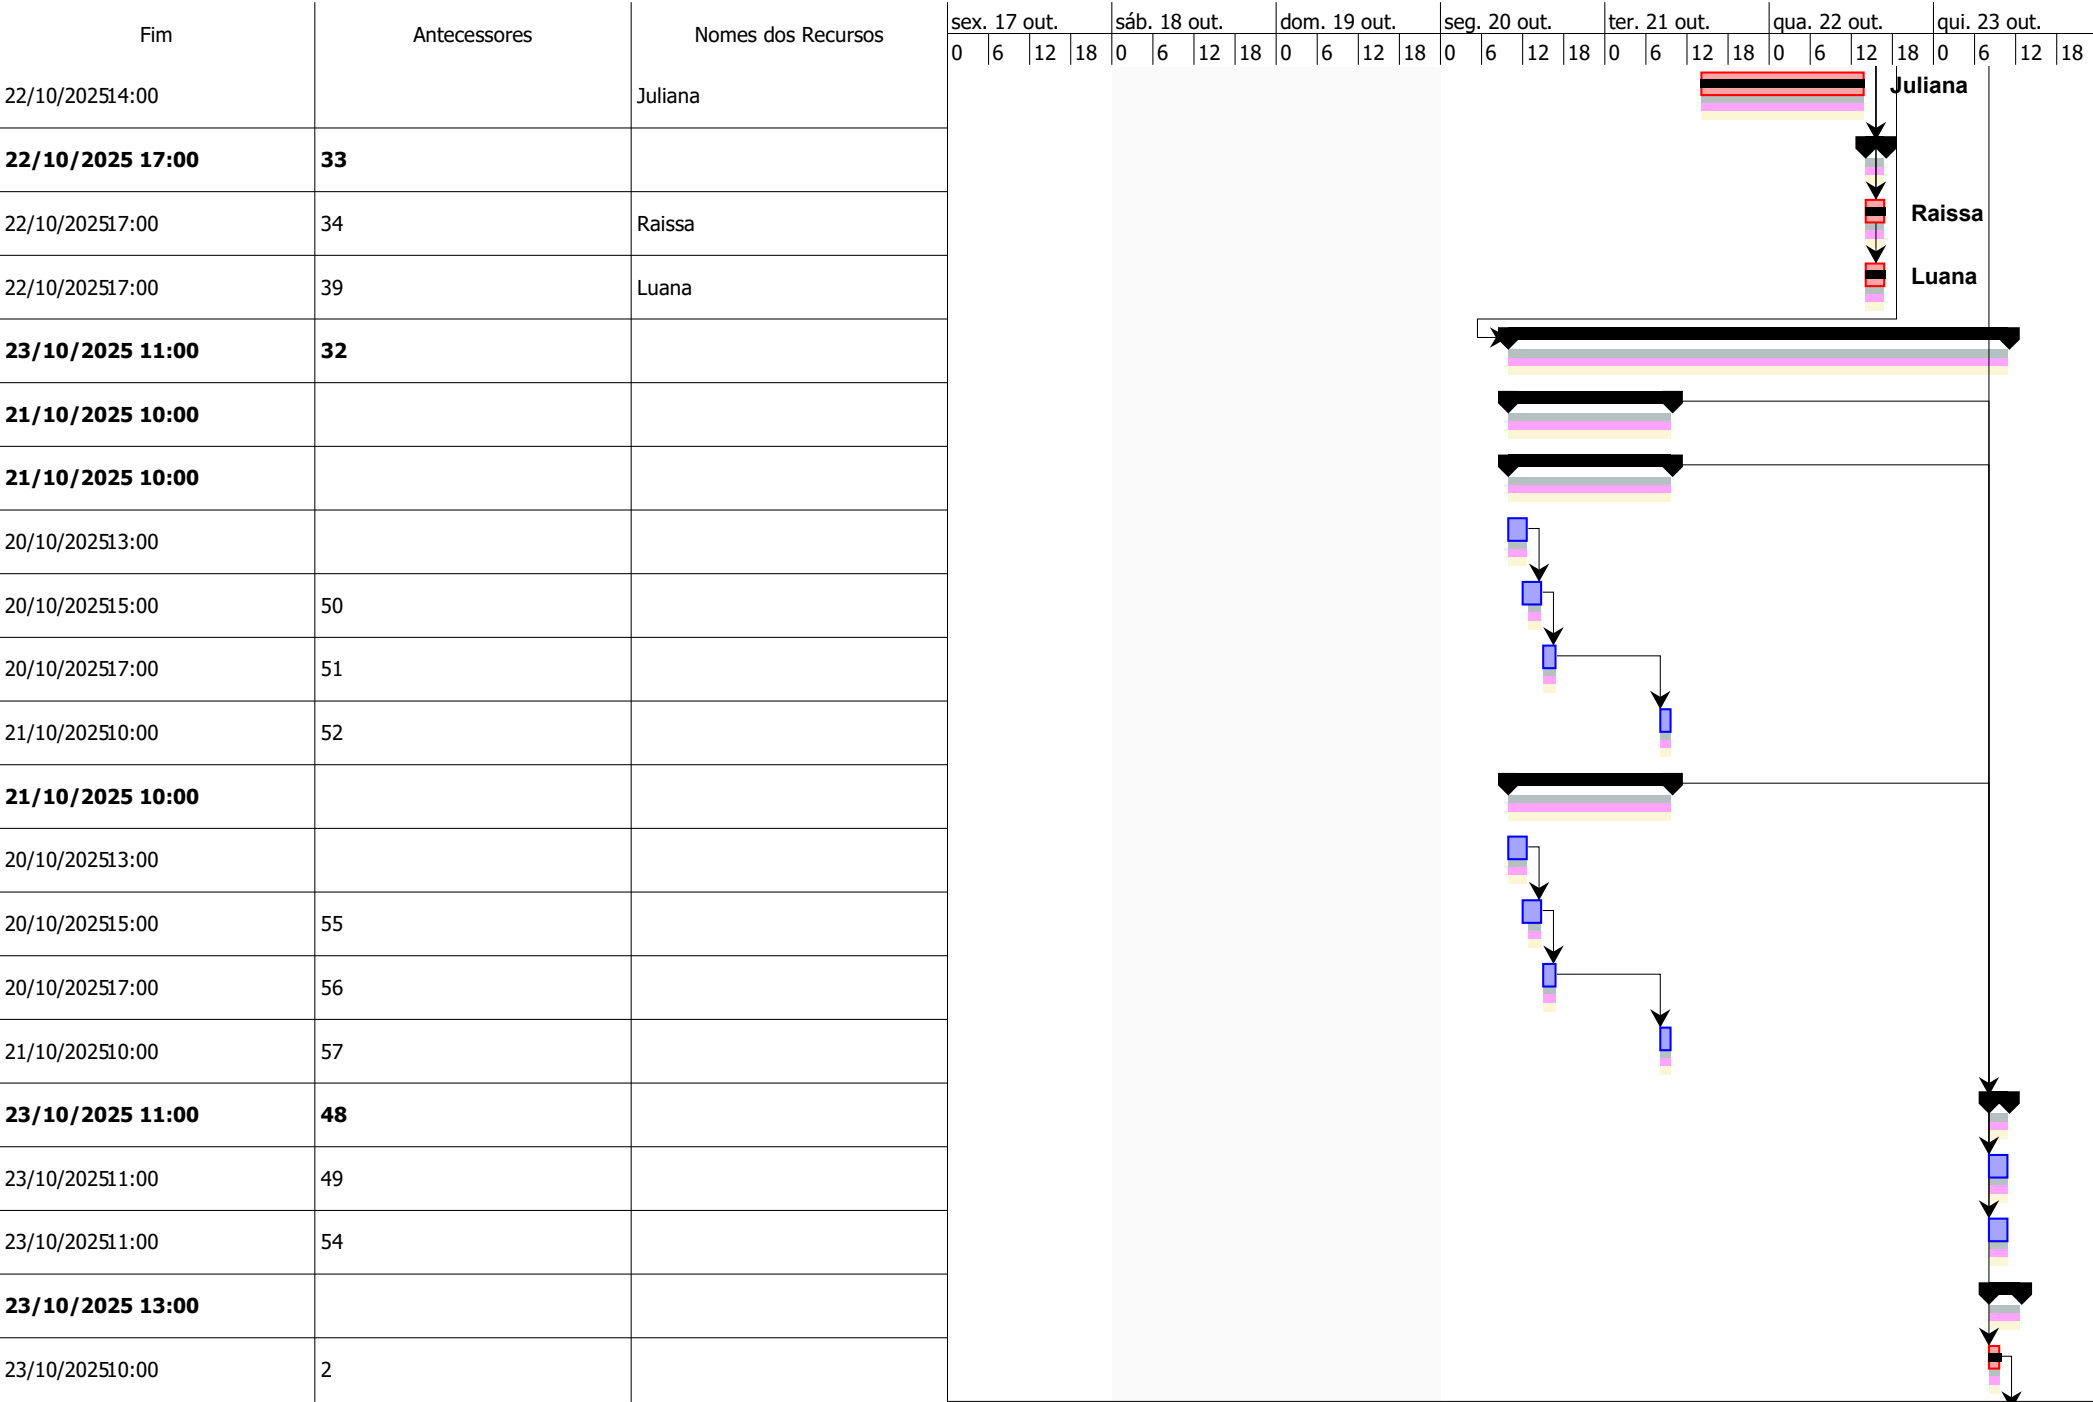
	Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
1		<input type="checkbox"/> Cronograma +LANCHES	135 horas	3,5 dias?	3,5 dias	2,93 dias	20/10/2025 08:00
2		<input type="checkbox"/> Prospecção	28 horas	3 dias	3 dias	3 dias	20/10/2025 08:00
3		<input type="checkbox"/> Est. Tamanho	16 horas	1,5 dias	1,5 dias	1,5 dias	20/10/2025 08:00
4		Estimar Tamnho do Projeto	8 horas	1 dia	0,5 dias	1 dia	20/10/202508:00
5		Revisar Estimativa do Projeto	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/202512:00
6		<input type="checkbox"/> Est. Cronograma e Orçamento	12 horas	1,5 dias	1,5 dias	1,5 dias	21/10/2025 12:00
7		Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminar	4 horas	0,5 dias	0,5 dias	0,5 dias	21/10/202512:00
8		Revisar Cronograma e Orçamento Preliminar	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	22/10/202508:00
9		<input type="checkbox"/> Análise	13 horas	1,125 dias	1,125 dias	1,125 dias	20/10/2025 08:00
10		<input type="checkbox"/> Documento de Requisitos	5 horas	0,625 dias	0,625 dias	0,625 dias	20/10/2025 12:00
11		Elaborar DRE	4 horas	0,5 dias	0,5 dias	0,5 dias	20/10/202512:00
12		Revisar DRE	1 hora	0,125 dias	0,125 dias	0,125 dias	21/10/202508:00
13		<input type="checkbox"/> MRB	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/2025 08:00
14		Elaborar MRB	6 horas	0,75 dias	0,75 dias	0,75 dias	20/10/202508:00
15		Revisar MRB	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/202515:00
16		<input type="checkbox"/> Implementação	90 horas	3,125 dias?	3,125 dias	2,361 dias	20/10/2025 10:00
17		<input type="checkbox"/> Release 01	22 horas	1,375 dias?	1,375 dias	1,375 dias	20/10/2025 10:00
18		<input type="checkbox"/> Implementação	16 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/2025 10:00
19		<input type="checkbox"/> RFC01 - Manter Produto	8 horas	0,75 dias	0,75 dias	0,75 dias	20/10/2025 10:00
20		RFS01 - Cadastrar Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/202510:00
21		RFS02 - Consultar Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/202510:00





		Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
22	✓	RFS03 - Atualizar Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 12:00
23	✓	RFS04 - Remover Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 15:00
24	✓	☐RFC02 - Manter Categoria	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/2025 10:00
25	✓	RFS05 - Cadastrar Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 10:00
26	✓	RFS06 - Consultar Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 12:00
27	✓	RFS07 - Atualizar Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 15:00
28	✓	RFS08 - Remover Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	21/10/2025 08:00
29	✓	☐Teste	6 horas	0,375 dias?	0,375 dias	0,375 dias	21/10/2025 10:00
30	✓	Testar RFC01 - Manter Produto	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0,375 dias	21/10/2025 10:00
31	✓	Testar RFC02 - Manter Categoria	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0,375 dias	21/10/2025 10:00
32	✓	☐Release 02	46 horas	1,375 dias?	1,375 dias	1,375 dias	21/10/2025 14:00
33	✓	☐Implementação	40 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	21/10/2025 14:00
34	✓	☐RFC03 - Manter Cliente	40 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	21/10/2025 14:00
35	✓	RFS09 - Cadastrar Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	21/10/2025 14:00
36	✓	RFS10 - Consultar Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	21/10/2025 16:00
37	✓	RFS11 - Atualizar Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	22/10/2025 09:00
38	✓	RFS12 - Remover Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	22/10/2025 11:00
39	✓	☐RFC04 - Manter Item do Pedido	32 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	21/10/2025 14:00
40	✓	RFS13 - Cadastrar Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00
41	✓	RFS14 - Consultar Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00
42	✓	RFS15 - Atualizar Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00



		Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
43		RFS16 - Remover Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00
44		<input type="checkbox"/> Teste	6 horas	0,375 dias?	0,375 dias	0,375 dias	22/10/2025 14:00
45		Testar RFC03 - Manter Cliente	3 horas	0,375 dias?	1 dia	0,375 dias	22/10/2025 14:00
46		Testar RFC04 - Manter Item do Pedido	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0,375 dias	22/10/2025 14:00
47		<input type="checkbox"/> Release 03	22 horas	3,125 dias?	3,125 dias	0 dias	20/10/2025 10:00
48		<input type="checkbox"/> Implementação	16 horas	1 dia?	1 dia	0 dias	20/10/2025 10:00
49		<input type="checkbox"/> RFC05 - Manter Pedido	16 horas	1 dia?	1 dia	0 dias	20/10/2025 10:00
50		RFS17 - Cadastrar Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	20/10/2025 10:00
51		RFS18 - Consultar Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	20/10/2025 13:00
52		RFS19 - Atualizar Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	20/10/2025 15:00
53		RFS20 - Remover Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	21/10/2025 08:00
54		<input type="checkbox"/> RFC06 - Manter Depósito	8 horas	1 dia?	1 dia	0 dias	20/10/2025 10:00
55		RFS21 - Cadastrar Depósito	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	20/10/2025 10:00
56		RFS22 - Consultar Depósito	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	20/10/2025 13:00
57		RFS23 - Atualizar Depósito	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	20/10/2025 15:00
58		RFS24 - Remover Depósito	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0 dias	21/10/2025 08:00
59		<input type="checkbox"/> Teste	6 horas	0,375 dias?	0,375 dias	0 dias	23/10/2025 08:00
60		RFC05 - Manter Pedido	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0 dias	23/10/2025 08:00
61		RFC06 - Manter Deposito	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0 dias	23/10/2025 08:00
62		<input type="checkbox"/> Gerência de Configuração	4 horas	0,5 dias	0,5 dias	0,5 dias	23/10/2025 08:00
63		Elaborar Branch	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	23/10/2025 08:00



		Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
64		Realizar Merge da Branch X para a Trunk	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	23/10/202510:00



Fim
23/10/202513:00

Antecessores				Nomes dos Recursos				sex. 17 out.				sáb. 18 out.				dom. 19 out.				seg. 20 out.				ter. 21 out.				qua. 22 out.				qui. 23 out.			
63								0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18
